

Con deliberazioni n. 5 della Conferenza dei Comuni del 21 dicembre 2020 sono stati approvati i Programma degli Interventi 2020-2023 dei Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato nell'ATO della Città Metropolitana di Milano: Cap Holding SpA e MM SpA.

I Gestori in ossequio a quanto previsto dalla “Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII” (Cfr. Deliberazione n. 6 del 30.05.2017 CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.) provvedono alla trasmissione, con cadenza semestrale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, della rendicontazione degli investimenti realizzati.

La consuntivazione degli interventi realizzati avviene mediante lo specifico tracciato di raccolta dei dati previsto dalla metodologia sopra richiamata.

Si riportano di seguito gli impegni posti a carico dei Gestori Cap Holding SpA e MM SpA per l'anno 2020, articolati nei diversi settori funzionali.

Servizio	Investimenti 2020 per servizio [€]
ACQ	20.696.449
DEP	15.091.637
FOG	23.595.754
G	3.055.864
I&S	1.383.572
SEDI	9.256.679
AAI	1.383.343
Totale	74.463.300

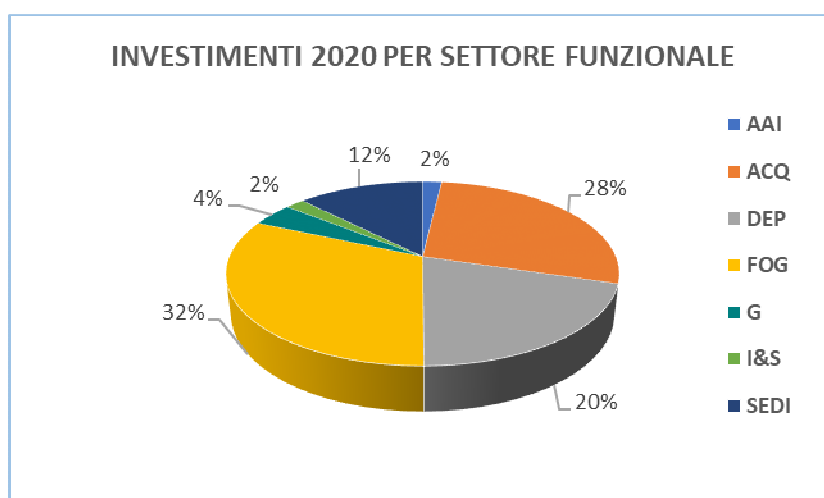


Fig. 1 – Programmato 2020 – Cap Holding Spa

Servizio	Investimenti 2020 per servizio [€]
ACQ	20.292.000
DEP	3.475.000
FOG	18.875.000
ALTRO	6.925.000
Totale	49.567.000


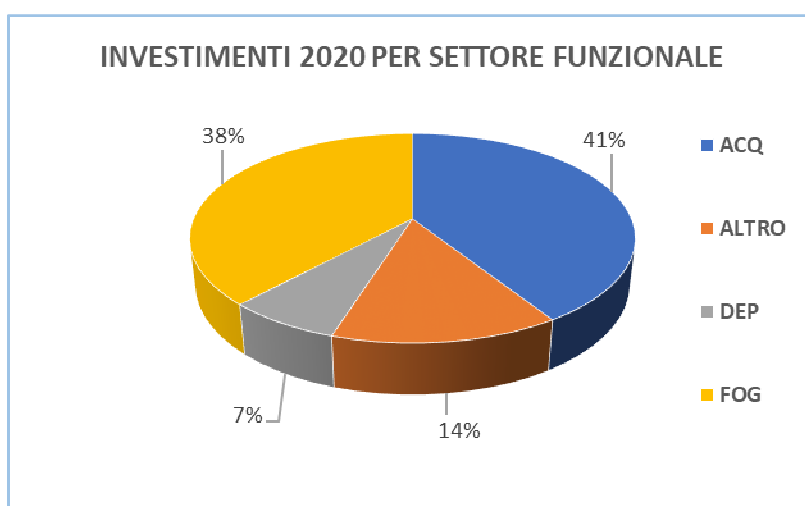


Fig. 2 – Programmato 2020 – MM Spa

Cap Holding Spa


Si riportano di seguito, per ogni settore funzionale, le risultanze dell'analisi comparativa tra gli investimenti programmati e quanto effettivamente realizzato al 31/12/2020.

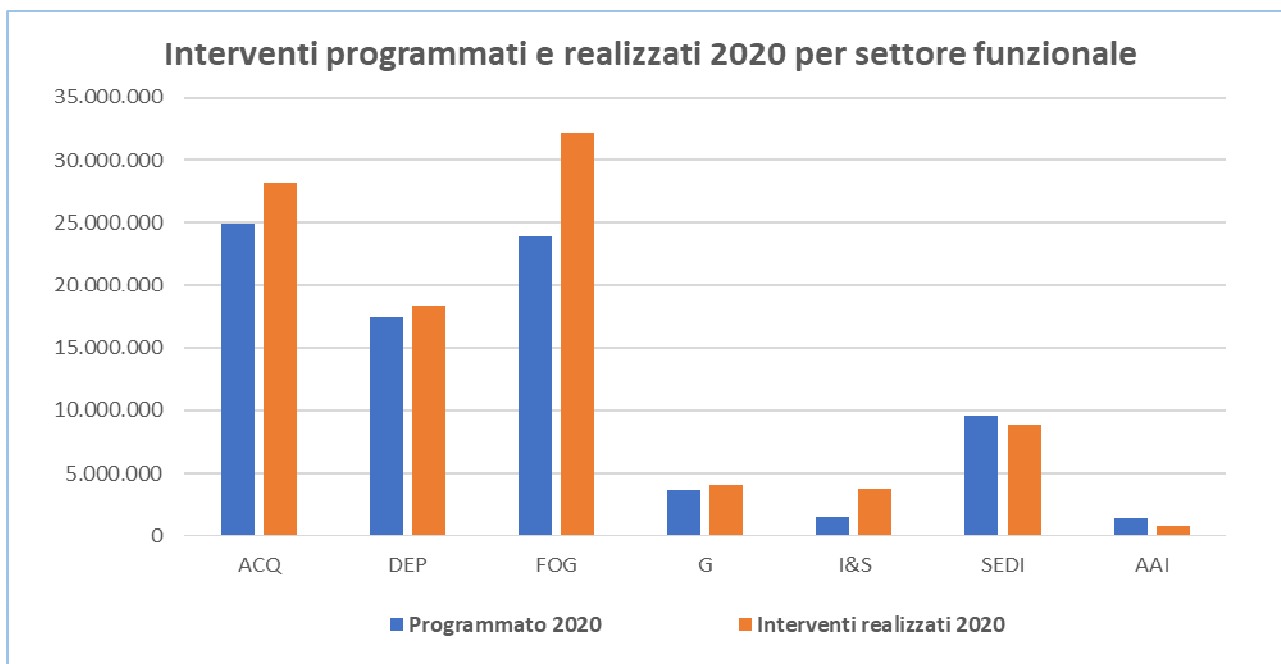

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo dal Gestore Cap Holding Spa, nel 2020, si attesta ad euro 96.331.897, che rappresenta il 129% dell'importo pianificato, pari ad euro 74.463.300.


Tale risultato però discende da una programmazione 2020 che ha tenuto conto della possibile riduzione della capacità produttiva del gestore Cap Holding SpA per via dell'emergenza sanitaria Covid-19, caratterizzata quindi da una mole di investimenti inferiore rispetto a quello degli anni precedenti (con compensazione negli anni 2021-2022).

Si riporta di seguito l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macro-indicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).

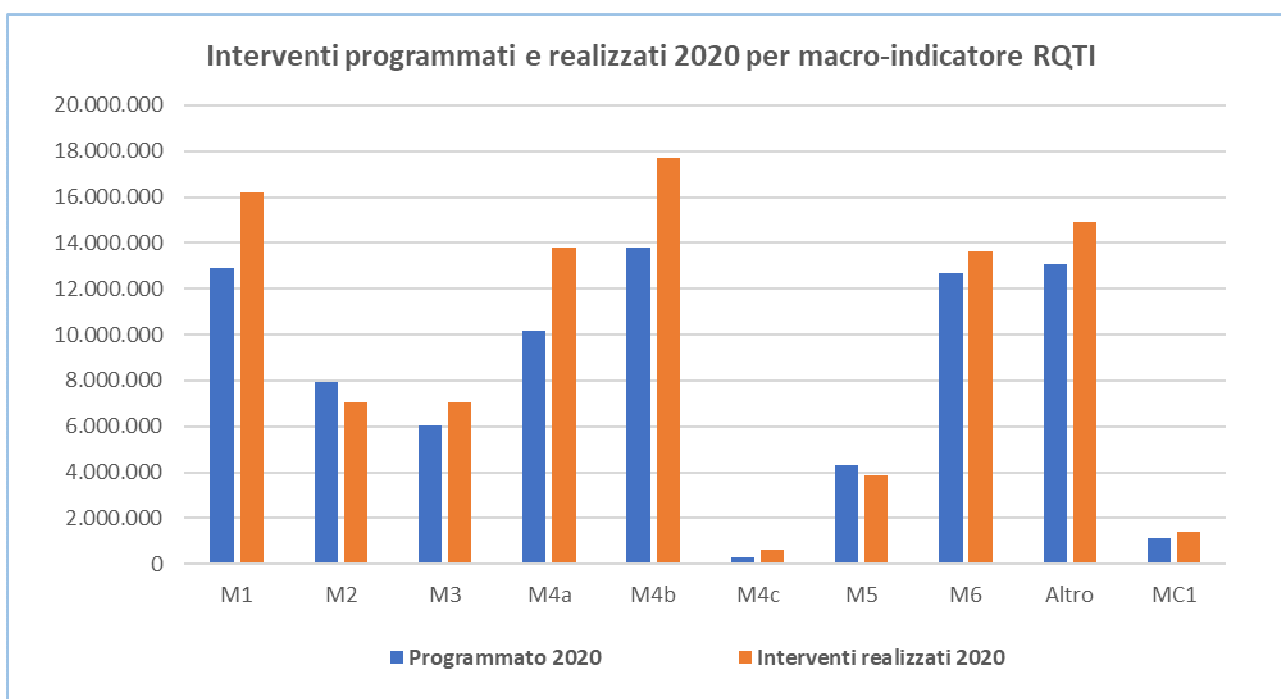

MM Spa

Si riporta di seguito la sintesi dello stato di attuazione, per settore funzionale, del programma degli interventi 2020 a carico del Gestore MM Spa.

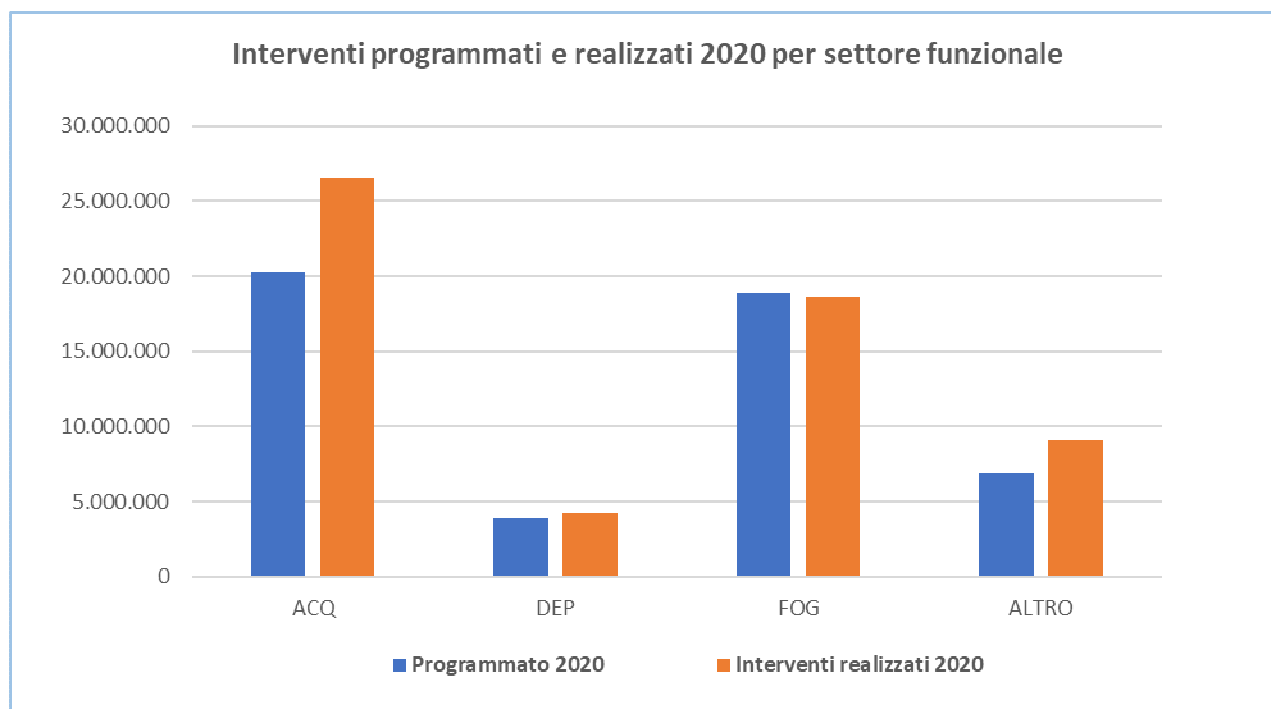

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati a consuntivo, nel 2020, si attesta ad euro 58.473.758, che rappresenta il 118% dell'importo pianificato, pari ad euro 49.567.000. Tale miglior risultato (come nel caso di Cap Holding) discende da una programmazione 2020 prudentiale (rispetto alla pianificazione 2019) per via della pandemia da Covid-19, che di fatto è stata affrontata dal gestore in modo resiliente.

Si riporta di seguito l'andamento degli interventi programmati/realizzati in funzione dei macro-indicatori previsti dalla regolazione della Qualità Tecnica (cfr. deliberazione ARERA n. 917/R/Idr).

